

CLT 仕様バス待合所意匠設計募集と公開組立の実施

全体イメージ（滝谷）



事業内容：森林整備加速化・林業再生交付金

発注者：刈羽村教育委員会

請負者：萩野工務店（滝谷地区 3 月設置）、堀工務店（新屋敷地区 2 月設置）

一次下請：(株)志田材木店（CLT 仕様部分）

意匠設計：ダイエープロビス(株)

「CLT 仕様に関する規格・提案～現在までの進行状況について」

- 27.11.20 越後杉 CLT 仕様バス待合所の事前説明及び協議打合せ会
- 27.11.25 越後杉 CLT 仕様バス待合所建設工事工程表提出（刈羽村教育委員会）
- 27.11.30 意匠設計図面の提出（提案図面 5 枚／会員 4 社協力／新 CLT 等普協）
- 27.12.02 意匠設計図面決定（刈羽村教育委員会）
- 27.12.10 CLT パネル割付図作製に伴う打合せ
- 27.12.18 接合金具や仕口の納まり等に関する打合せ
- 27.12.21 越後杉ラミナ材の出荷（山佐木材(株)／鹿児島肝属郡肝付町）
- 28.01.08 越後杉 CLT パネル到着
- 28.01.14 越後杉 CLT パネルカット（1/12～14）
- 28.01.18 アンカーボルト現場測定（新屋敷）
- 28.01.26 越後杉 CLT パネル加工（1/15～26）
- 28.01.26 越後杉 CLT パネル工場塗装（1/20～26）
- 28.01.27 越後杉 CLT パネル工場組立（13：00～15：00／(株)志田材木店工場内）
- 28.01.29 越後杉 CLT 仕様バス待合所現場設置（2/2 サッシ、板金完了）
- 28.02.25 越後杉 CLT パネル工場組立（10：00～12：00／(株)志田材木店工場内）
- 28.02.26 越後杉 CLT 仕様バス待合所現場設置（後日、サッシ及び板金作業）
- 28.03.18 越後杉 CLT 仕様バス待合所現場完了




状況写真

寄り合う場
(在来工法+一部CLT工
法)

バス待合所 完成

新屋敷

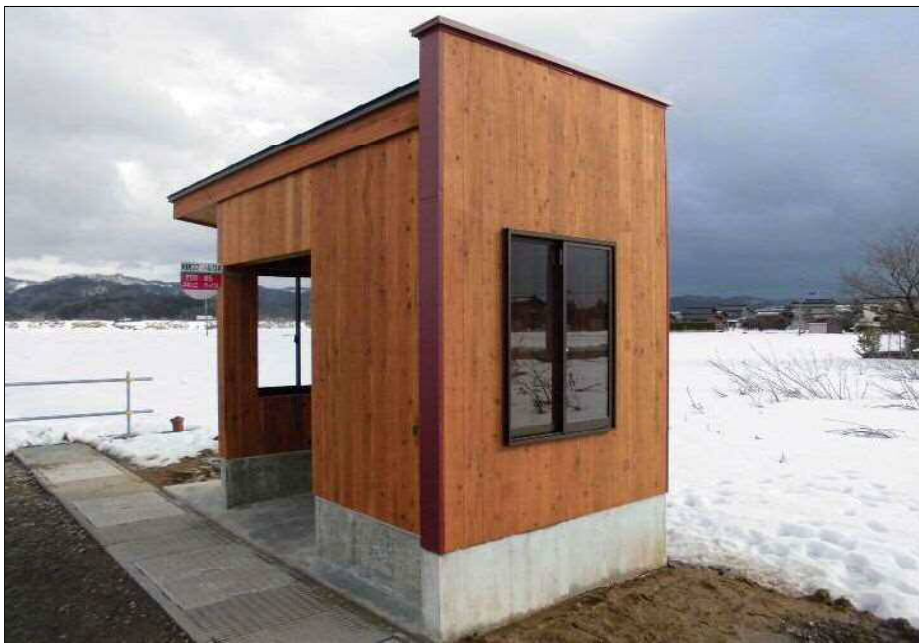

状況写真

寄り合う場
(在来工法+一部CLT工
法)

バス待合所 完成

新屋敷



状況写真

寄り合う場
(在来工法+一部CLT工
法)

バス待合所 完成

新屋敷

CLTベンチ



状況写真

平成28年3月18日(金)

滝谷

設置完成



状況写真

平成28年3月18日(金)

滝谷

設置完成



状況写真

平成28年3月18日(金)

滝谷

設置完成
